


第2次中長期ビジョンの状況（計画事業の進捗）

参考資料2


【水道事業】

①配水幹線の耐震化率

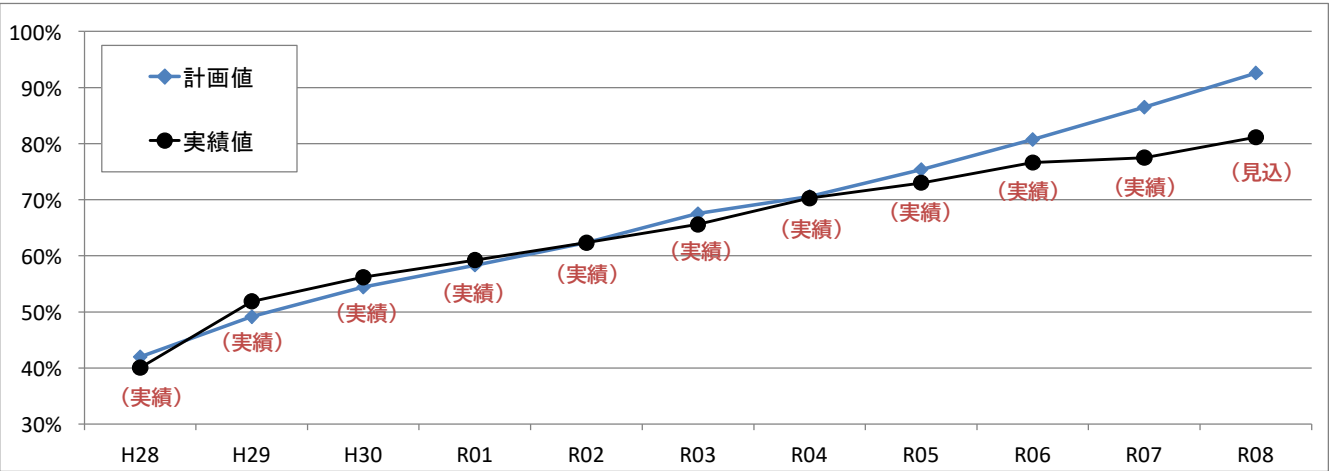


		H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
第2次 中長期ビジョン	耐震管延長(km)	43.0	50.3	55.7	59.7	63.8	69.1	72.2	77.1	82.6	88.5	94.7
	全体延長(km)	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3
	耐震化率(%)	42.0%	49.2%	54.4%	58.4%	62.4%	67.5%	70.6%	75.4%	80.7%	86.5%	92.6%
実績及び見込	耐震管延長(km)	41.0	53.1	57.5	60.6	63.8	67.1	71.9	74.7	78.4	79.3	83.0
	全体延長(km)	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3	102.3
	耐震化率(%)	40.1%	51.9%	56.2%	59.2%	62.4%	65.6%	70.3%	73.0%	76.6%	77.5%	81.1%
R8年度目標値に対する進捗率		43.3%	56.1%	60.7%	64.0%	67.4%	70.9%	75.9%	78.9%	82.8%	83.7%	87.6%

③給水拠点整備達成率

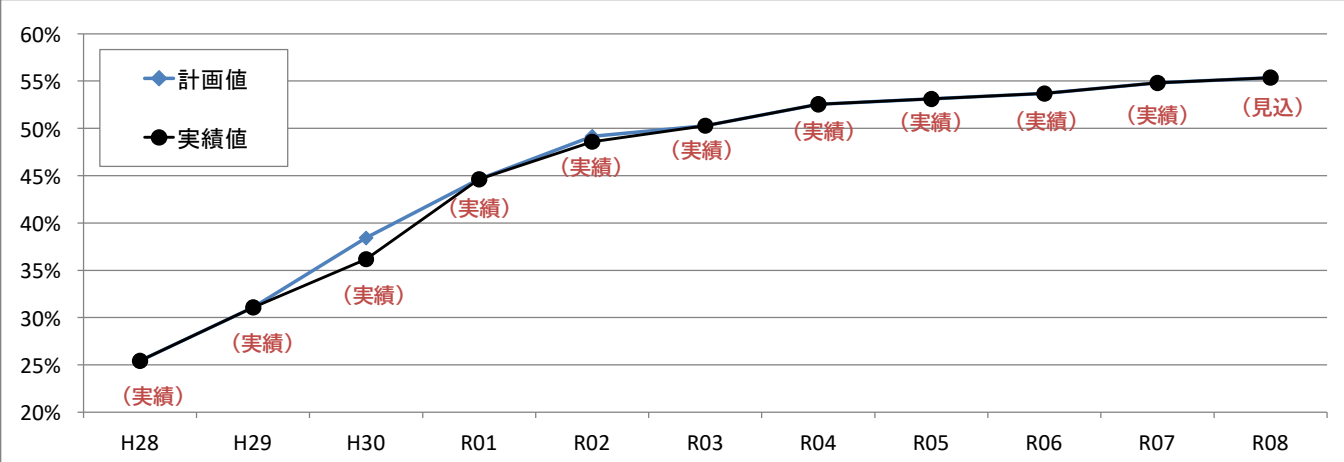

		H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
第2次 中長期ビジョン	整備箇所数	45	55	68	79	87	89	93	94	95	97	98
	全体箇所数	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
	整備率	25.4%	31.1%	38.4%	44.6%	49.2%	50.3%	52.5%	53.1%	53.7%	54.8%	55.4%
実績及び見込	整備箇所数	45	55	64	79	86	89	93	94	95	97	98
	全体箇所数	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
	整備率	25.4%	31.1%	36.2%	44.6%	48.6%	50.3%	52.5%	53.1%	53.7%	54.8%	55.4%
R8年度目標値に対する進捗率		45.9%	56.1%	65.3%	80.6%	87.8%	90.8%	94.9%	95.9%	96.9%	99.0%	100.0%

②全水道管路の耐震化率

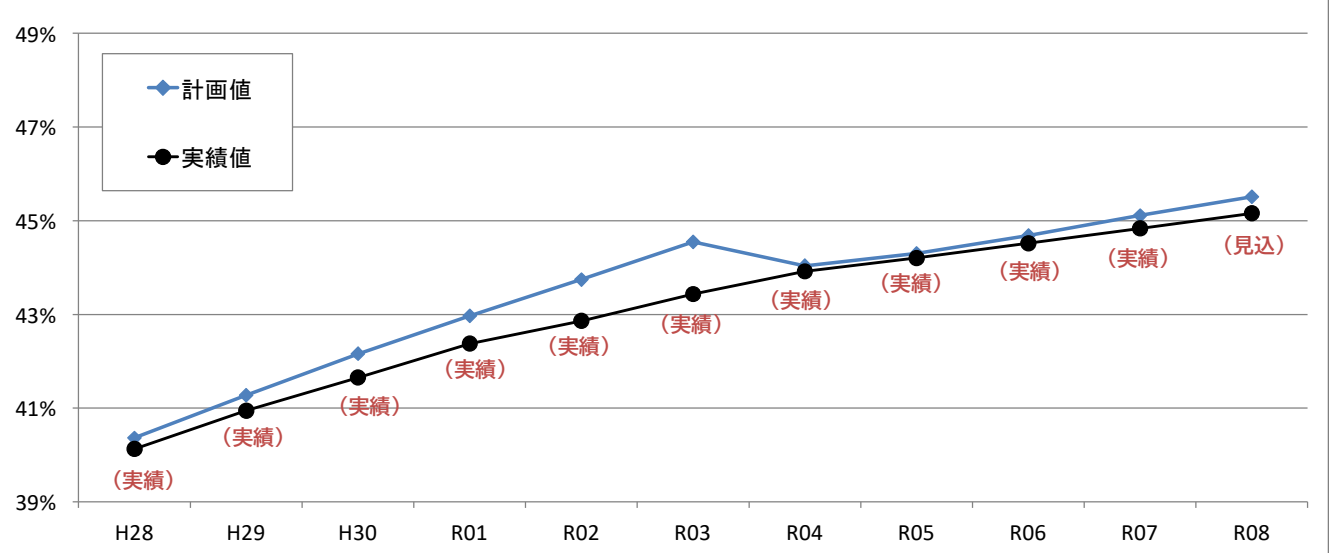


		H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
第2次 中長期ビジョン	耐震管延長(km)	1,267.2	1,297.4	1,327.3	1,355.4	1,381.7	1,408.6	1,404.4	1,417.2	1,430.4	1,445.3	1,459.2
	全体延長(km)	3,139.4	3,142.9	3,148.2	3,154.2	3,158.4	3,161.8	3,196.2	3,198.7	3,201.1	3,203.7	3,206.1
	耐震化率(%)	40.4%	41.3%	42.2%	43.0%	43.7%	44.6%	44.0%	44.3%	44.7%	45.1%	45.5%
実績及び見込	耐震管延長(km)	1,261.6	1,294.8	1,320.8	1,347.7	1,366.9	1,387.1	1,406.1	1,417.8	1,431.3	1,444.4	1,455.4
	全体延長(km)	3,143.5	3,162.0	3,170.7	3,180.0	3,188.8	3,193.4	3,201.4	3,207.2	3,214.9	3,221.3	3,222.7
	耐震化率(%)	40.1%	40.9%	41.7%	42.4%	42.9%	43.4%	43.9%	44.2%	44.5%	44.8%	45.2%
R8年度目標値に対する進捗率		88.2%	90.0%	91.5%	93.1%	94.2%	95.4%	96.5%	97.1%	97.8%	98.5%	99.2%

第2次中長期ビジョンの状況（計画事業の進捗）


【下水道事業】

①老朽管対策を実施したコンクリート管の割合

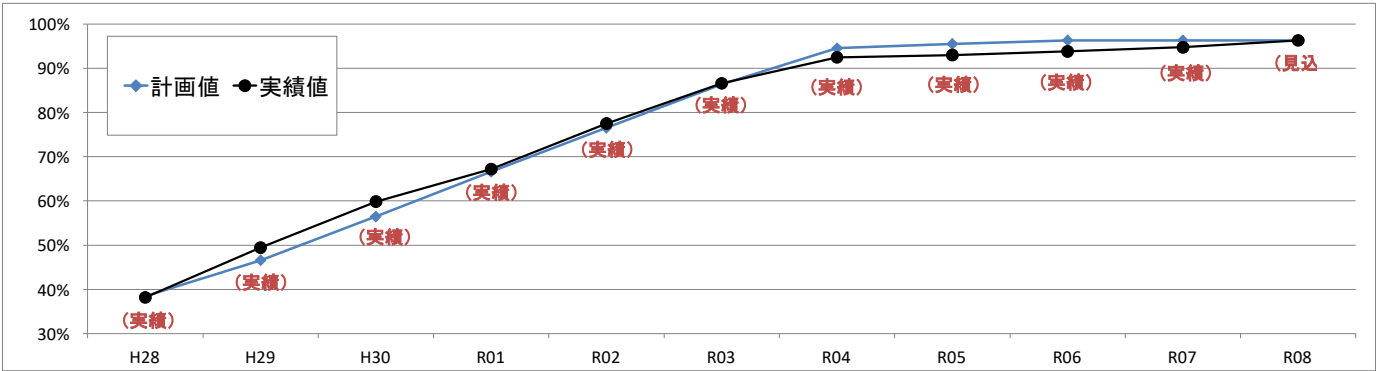


		H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
第2次 中長期ビジョ ン	管内調査により 健全である延長(km)	185.2	221.2	266.2	311.2	356.2	401.2	437.2	437.2	437.2	437.2	437.2
	改築した延長(km)	9.1	14.1	19.1	25.1	30.1	35.1	40.1	45.1	49.1	49.1	49.1
	合計(km) ①+②	194.3	235.3	285.3	336.3	386.3	436.3	477.3	482.3	486.3	486.3	486.3
	全コンクリート管の延長 (km)	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0
	老朽管対策を実施したコ ンクリート管の割合(%)	38.5%	46.6%	56.5%	66.6%	76.5%	86.4%	94.5%	95.5%	96.3%	96.3%	96.3%
実績及び見込	管内調査により 健全である延長(km)	184.4	239.2	285.0	315.8	360.8	403.0	431.6	431.6	431.6	431.6	431.6
	改築した延長(km)	8.4	10.6	17.2	23.6	30.6	34.4	35.2	38.0	42.2	46.9	54.7
	合計(km) ①+②	192.8	249.8	302.2	339.4	391.4	437.4	466.8	469.6	473.8	478.5	486.3
	全コンクリート管の延長 (km)	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0	505.0
	老朽管対策を実施したコ ンクリート管の割合(%)	38.2%	49.5%	59.8%	67.2%	77.5%	86.6%	92.4%	93.0%	93.8%	94.8%	96.3%
R8年度目標値に対する進捗率		39.6%	51.4%	62.1%	69.8%	80.5%	89.9%	96.0%	96.6%	97.4%	98.4%	100.0%

②大雨に対して安全である地区の面積の割合

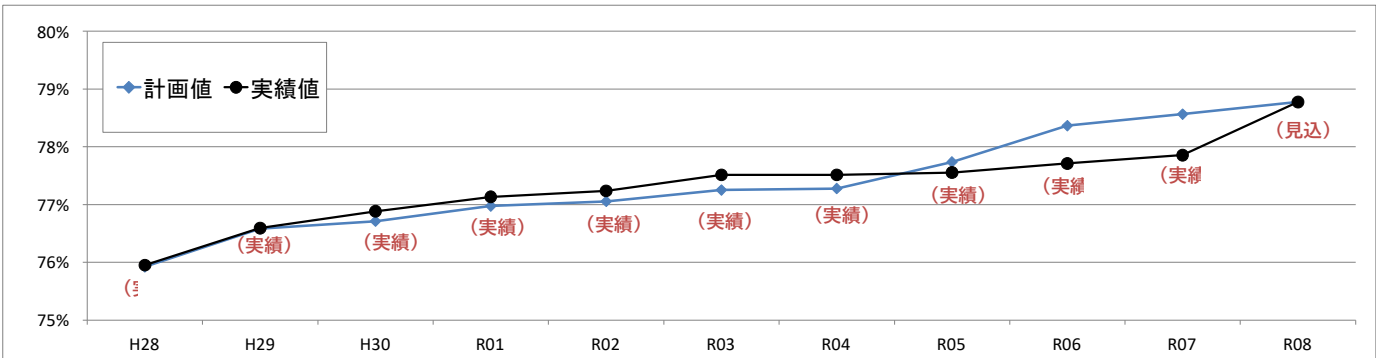

		H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
第2次 中長期ビジョ ン	大雨に対して安全である 地区の面積 (ha)	5,777	5,827	5,837	5,857	5,863	5,878	5,880	5,915	5,963	5,978	5,994
	全体面積 (ha)	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609
	大雨に対して安全である 地区の面積の割合 (%)	75.9%	76.6%	76.7%	77.0%	77.1%	77.3%	77.3%	77.7%	78.4%	78.6%	78.8%
実績及び見込	大雨に対して安全である 地区の面積 (ha)	5,779	5,828	5,850	5,869	5,877	5,898	5,898	5,901	5,913	5,924	5,994
	全体面積 (ha)	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609	7,609
	大雨に対して安全である 地区の面積の割合 (%)	75.9%	76.6%	76.9%	77.1%	77.2%	77.5%	77.5%	77.6%	77.7%	77.9%	78.8%
R8年度目標値に対する進捗率		96.4%	97.2%	97.6%	97.9%	98.0%	98.4%	98.4%	98.4%	98.6%	98.8%	100.0%

③水洗化率

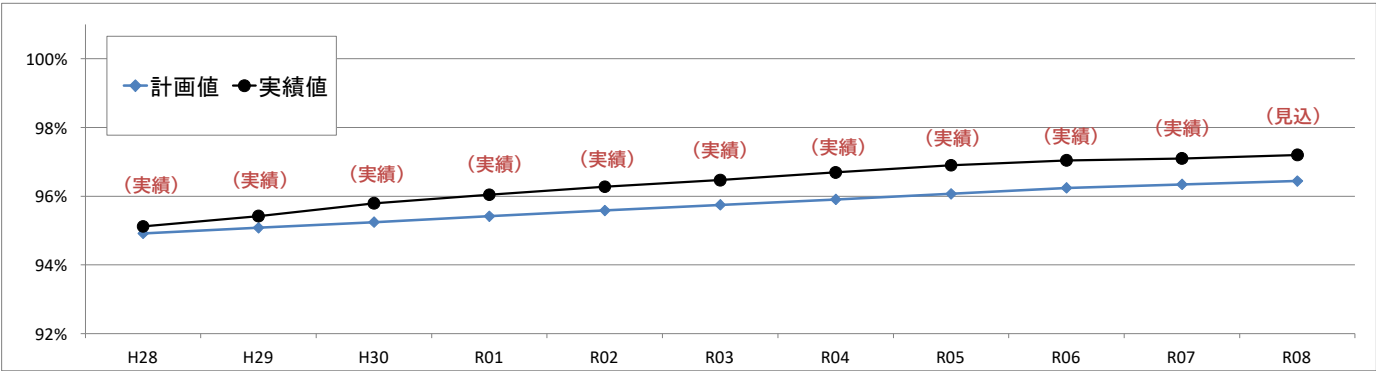

		H28	H29	H30	R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08
第2次 中長期ビジョ ン	処理区域内人口 (人)	380,126	378,494	376,862	375,230	373,208	371,186	369,164	367,142	365,121	362,724	360,327
	水洗便所設置済人口 (人)	360,809	359,878	358,941	358,040	356,720	355,393	354,060	352,720	351,414	349,462	347,506
	水洗化率 (%)	94.9%	95.1%	95.2%	95.4%	95.6%	95.7%	95.9%	96.1%	96.2%	96.3%	96.4%
実績及び見込	処理区域内人口 (人)	383,857	384,206	384,428	383,650	384,793	382,749	380,585	378,379	376,590	375,077	371,559
	水洗便所設置済人口 (人)	365,136	366,611	368,257	368,480	370,478	369,241	368,000	366,662	365,461	364,468	361,155
	水洗化率 (%)	95.1%	95.4%	95.8%	96.0%	96.3%	96.5%	96.7%	96.9%	97.0%	97.2%	97.2%
R8年度目標値に対する進捗率		98.6%	98.9%	99.3%	99.6%	99.8%	100.0%	100.3%	100.5%	100.6%	100.8%	100.8%

R8の見込は、R6富山市将来人口推計報告書の行政人口から推定
