

# 令和 6 年 6 月市議会定例会

## 上下水道局

### 議案説明資料

#### 目 次

##### 【予算案件】

- 1 継続費の変更について（公共下水道事業会計） ..... 1 頁

##### 【条例案件】

- 2 富山市附属機関設置条例の一部改正について ..... 3 頁

##### 【報告案件】

- 3 令和 5 年度富山市水道事業会計継続費繰越内訳調書 ..... 4 頁
- 4 令和 5 年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書 ..... 5 頁
- 5 令和 5 年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書 ..... 6 頁
- 6 令和 5 年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書 ..... 8 頁

# 1 継続費の変更について（公共下水道事業会計）

## I 富山公共下水道大沢野浄化センター汚泥脱水設備外改築工事委託 における継続費の金額及び期間の変更について

### （1）全体概要


大沢野浄化センターは、日本下水道事業団の技術的援助を受けて建設した基幹施設であり、施設の老朽化に伴う改築・更新や耐震化などの工事について、高度な技術を有し本処理場の構造等に精通している日本下水道事業団に委託し、対策を進めてきたところである。

本業務は、汚泥を脱水する際に必要となる薬品を注入するための機械及び電気設備が設置から19～31年経過し劣化が見受けられることから、日本下水道事業団に設備の改築工事を委託するものである。

- ・受託者 地方共同法人 日本下水道事業団
- ・協定額 200,000,000円  
(事業費200,000千円)
- ・協定期間 令和5年8月24日 から 令和7年3月31日 まで



薬品溶解タンク

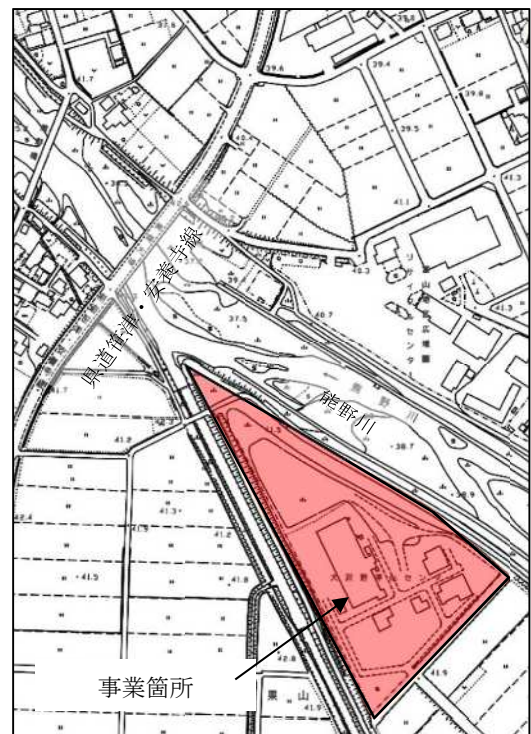

大沢野浄化センター H4. 4 供用開始

## (2) 変更理由

ア 日本下水道事業団への委託工事では、日本下水道事業団において入札による事業者選定を行っている。本業務の機械設備の改築工事と電気設備の改築工事の入札を行ったところ、電気設備の施工者は決定したが、機械設備の施工者は2度の入札を行ったが決定しなかったため、協定期間内での完成が困難となり継続費の期間延長を行う必要が生じたもの。

イ 機械設備の改築工事は当初、令和5年度単価を採用し発注したが、入札不調・不落により令和6年度での再度発注となることから、令和6年度単価の採用に伴う労務単価や材料価格の上昇分を増額するもの。

(15,000千円の増額)


## (3) 協定期間

|                             | 令和5年度                                                                                                           | 令和6年度 | 令和7年度 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 協定期間<br>(協定内容)              | 令和5年8月24日～<br>令和7年3月31日                                                                                         |       |       |
| 機械設備<br>・機器製作・据付<br>・試験調整 等 |                             |       |       |
| 電気設備<br>・機器製作・据付<br>・試験調整 等 | 令和5年8月24日～<br>令和7年7月31日<br> |       |       |

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 当初 |  |
| 変更 |  |

## (4) 変更(案)

(単位：千円)

|           | 令和5年度  | 令和6年度   | 令和7年度                                                                                | 計       |
|-----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 当初<br>年割額 | 64,000 | 136,000 |  | 200,000 |
| 変更<br>年割額 | 64,000 | 136,000 | 15,000                                                                               | 215,000 |

## 2 富山市附属機関設置条例の一部改正について

### (1) 趣旨

上下水道事業管理者の附属機関として「富山市上下水道事業経営審議会」を設置するもの。

### (2) 改正理由

本市の上下水道事業（工業用水道事業含む）は、施設の老朽化に伴う更新需要に加え、能登半島地震の発生などを受け、耐震化の更なる推進が必要となる一方で、人口減少等に伴う料金収入の減少などにより、今後、一段と経営状況が厳しさを増すことが想定されている。

市民生活を支える重要な生活基盤である上下水道サービスを将来にわたり安定的に提供していくためには、今後一層、業務の効率化や財政基盤の強化など公営企業としての経営改善が求められることから、本市の上下水道事業の経営全般について外部有識者等の視点から審議いただくため、上下水道事業管理者の附属機関を設ける。

### (3) 附属機関の概要

ア 名称

富山市上下水道事業経営審議会

イ 所掌事務

富山市上下水道事業の経営に関する事項について審議する事務

ウ 委員の定数

15人以内

エ 委員の任期

2年

### (4) 施行期日

令和6年7月1日

### 3 令和5年度富山市水道事業会計継続費繰越内訳調書

#### 1 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和5年度設定継続費]

(単位：円)

| 事業名及び名称         | 全体計画        |       |             | 支払義務発生額 | 残額         | 翌年度<br>通次繰越額 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|---------|------------|--------------|
| 流杉浄水場中央監視設備更新工事 | 220,000,000 | 令和5年度 | 88,000,000  | 0       | 88,000,000 | 88,000,000   |
|                 |             | 令和6年度 | 132,000,000 |         |            |              |

#### 2 繰越する事業の概要

【繰越理由】

資材の調達が困難なことにより機器製作に不測の日数を要したため

(令和5年度通次繰越額内訳)

(単位：円)

| 事業名及び名称           | 予算計上額      | 支払義務<br>発生額 | 予算残額       | 翌年度<br>通次繰越額 | 不用額 | 完成（予定）日 |
|-------------------|------------|-------------|------------|--------------|-----|---------|
| 流杉浄水場中央監視設備更新工事   | 88,000,000 | 0           | 88,000,000 | 88,000,000   | 0   |         |
| 1 流杉浄水場中央監視設備更新工事 | 88,000,000 | 0           | 88,000,000 | 88,000,000   | 0   | R7.2.28 |
| 合計                | 88,000,000 | 0           | 88,000,000 | 88,000,000   | 0   |         |

## 4 令和5年度富山市公共下水道事業会計継続費繰越内訳調書

1 地方公営企業法施行令第18条の2の規定による継続費の通次繰越額

[令和5年度設定継続費]

(単位：円)

| 事業名及び名称              | 全体計画          |       |             | 支払義務発生額     | 残額          | 翌年度<br>通次繰越額 |
|----------------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 呉羽苑貯留池整備事業費          | 1,070,000,000 | 令和4年度 | 570,000,000 | 570,000,000 | 0           | 0            |
|                      |               | 令和5年度 | 364,000,000 | 744,000     | 363,256,000 | 363,256,000  |
|                      |               | 令和6年度 | 136,000,000 |             |             |              |
| 下富居貯留池整備事業費          | 880,000,000   | 令和4年度 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0           | 0            |
|                      |               | 令和5年度 | 330,000,000 | 234,365,120 | 95,634,880  | 95,634,880   |
|                      |               | 令和6年度 | 270,000,000 |             |             |              |
| 浜黒崎浄化センター管理本館設備更新事業費 | 503,400,000   | 令和5年度 | 110,000,000 | 0           | 110,000,000 | 110,000,000  |
|                      |               | 令和6年度 | 393,400,000 |             |             |              |
| 大山水処理場汚泥処理設備更新事業費    | 510,000,000   | 令和5年度 | 81,000,000  | 0           | 81,000,000  | 81,000,000   |
|                      |               | 令和6年度 | 429,000,000 |             |             |              |
| 大沢野浄化センター汚泥処理設備更新事業費 | 200,000,000   | 令和5年度 | 64,000,000  | 0           | 64,000,000  | 64,000,000   |
|                      |               | 令和6年度 | 136,000,000 |             |             |              |
| ポンプ場改築事業費            | 364,000,000   | 令和5年度 | 36,000,000  | 0           | 36,000,000  | 36,000,000   |
|                      |               | 令和6年度 | 233,000,000 |             |             |              |
|                      |               | 令和7年度 | 95,000,000  |             |             |              |
| 本郷第5雨水幹線整備事業費        | 950,000,000   | 令和5年度 | 270,000,000 | 0           | 270,000,000 | 270,000,000  |
|                      |               | 令和6年度 | 340,000,000 |             |             |              |
|                      |               | 令和7年度 | 340,000,000 |             |             |              |

2 繰越する事業の概要

【繰越理由】

公園管理者や地元関係者等との協議に不測の日数を要したため

(令和5年度通次繰越額内訳)

(単位：円)

| 事業名及び名称                    | 予算計上額         | 支払義務<br>発生額 | 予算残額          | 翌年度<br>通次繰越額  | 不用額 | 完成（予定）日   |
|----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----|-----------|
| 呉羽苑貯留池整備事業費                | 364,000,000   | 744,000     | 363,256,000   | 363,256,000   | 0   |           |
| 1 新鍛冶川排水区呉羽町地区呉羽苑貯留池築造工事   | 364,000,000   | 744,000     | 363,256,000   | 363,256,000   | 0   | R7. 2. 28 |
| 下富居貯留池整備事業費                | 330,000,000   | 234,365,120 | 95,634,880    | 95,634,880    | 0   |           |
| 2 下富居排水区下富居二丁目地区下富居貯留池築造工事 | 330,000,000   | 234,365,120 | 95,634,880    | 95,634,880    | 0   | R7. 1. 31 |
| 浜黒崎浄化センター管理本館設備更新事業費       | 110,000,000   | 0           | 110,000,000   | 110,000,000   | 0   |           |
| 3 浜黒崎浄化センター管理本館受変電設備外改築工事  | 110,000,000   | 0           | 110,000,000   | 110,000,000   | 0   | R7. 3. 14 |
| 大山水処理場汚泥処理設備更新事業費          | 81,000,000    | 0           | 81,000,000    | 81,000,000    | 0   |           |
| 4 大山水処理場汚泥脱水設備外改築工事委託      | 81,000,000    | 0           | 81,000,000    | 81,000,000    | 0   | R7. 3. 31 |
| 大沢野浄化センター汚泥処理設備更新事業費       | 64,000,000    | 0           | 64,000,000    | 64,000,000    | 0   |           |
| 5 大沢野浄化センター汚泥脱水設備外改築工事委託   | 64,000,000    | 0           | 64,000,000    | 64,000,000    | 0   | R7. 3. 31 |
| ポンプ場改築事業費                  | 36,000,000    | 0           | 36,000,000    | 36,000,000    | 0   |           |
| 6 岩瀬汚水中継ポンプ場沈砂設備外改築工事委託    | 36,000,000    | 0           | 36,000,000    | 36,000,000    | 0   | R7. 3. 31 |
| 本郷第5雨水幹線整備事業費              | 270,000,000   | 0           | 270,000,000   | 270,000,000   | 0   |           |
| 7 本郷第一排水区本郷新地区本郷第5雨水幹線築造工事 | 270,000,000   | 0           | 270,000,000   | 270,000,000   | 0   | R7. 2. 28 |
| 合計                         | 1,255,000,000 | 235,109,120 | 1,019,890,880 | 1,019,890,880 | 0   |           |

## 5 令和5年度富山市水道事業会計予算繰越内訳調書

### 1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和5年度内に完了することが困難となった事業について令和6年度へ繰越措置を行ったもの。

総額： 854,494,780 円

### 2 主な繰越理由

①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため

②他の関連工事との調整等に日数を要したため

③その他

### 3 繰越内訳書

(単位：円)

| 事業名及び名称     |                                | 予算計上額       | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額      | 不用額       | 完成(予定)日 | 繰越理由 |
|-------------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|---------|------|
| 配水ブロック整備事業費 |                                | 12,353,000  | 0       | 11,660,000  | 693,000   |         |      |
| 1           | 布谷配水池外改良実施設計業務委託               | 12,353,000  | 0       | 11,660,000  | 693,000   | R6.4.26 | ①    |
| 配水幹線整備事業費   |                                | 717,504,600 | 0       | 707,849,000 | 9,655,600 |         |      |
| 2           | 新水橋幹線配水管布設(第2工区)工事             | 59,541,900  | 0       | 59,303,200  | 238,700   | R6.5.31 | ③    |
| 3           | 新水橋幹線防護管布設(第1工区)工事             | 90,255,000  | 0       | 82,500,000  | 7,755,000 | R6.8.23 | ①    |
| 4           | 北部幹線配水管布設替(第8工区)工事             | 99,293,700  | 0       | 99,101,200  | 192,500   | R6.4.30 | ③    |
| 5           | 北部幹線配水管布設替(第10工区)工事            | 41,932,000  | 0       | 41,458,100  | 473,900   | R6.4.12 | ②    |
| 6           | 北部幹線配水管布設替(第12工区)工事            | 94,402,000  | 0       | 94,050,000  | 352,000   | R6.7.26 | ②    |
| 7           | 北部幹線防護管布設(第2工区)工事              | 139,304,000 | 0       | 139,260,000 | 44,000    | R6.9.13 | ①    |
| 8           | 南部幹線配水管布設替(第1工区)工事             | 63,756,000  | 0       | 63,534,900  | 221,100   | R6.8.23 | ①    |
| 9           | 南部幹線配水管布設替(第2工区)工事             | 59,807,000  | 0       | 59,655,200  | 151,800   | R6.8.23 | ①    |
| 10          | 南部幹線配水管布設替(第3工区)工事             | 68,453,000  | 0       | 68,226,400  | 226,600   | R6.8.23 | ①    |
| 11          | 北部幹線配水管布設替(第12工区)工事に伴う支障物件移転補償 | 760,000     | 0       | 760,000     | 0         | R6.9.6  | ②    |
| 配水管整備事業費    |                                | 870,100     | 0       | 866,800     | 3,300     |         |      |
| (2)         | 新水橋幹線配水管布設(第2工区)工事             | 870,100     | 0       | 866,800     | 3,300     | R6.5.31 | ③    |

| 事業名及び名称     |                        | 予算計上額       | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額      | 不用額        | 完成(予定)日  | 繰越理由 |
|-------------|------------------------|-------------|---------|-------------|------------|----------|------|
| 老朽管整備事業費    |                        | 100,279,300 | 0       | 98,931,600  | 1,347,700  |          |      |
| (4)         | 北部幹線配水管布設替(第8工区)工事     | 11,509,300  | 0       | 11,486,200  | 23,100     | R6.4.30  | ③    |
| (5)         | 北部幹線配水管布設替(第10工区)工事    | 8,690,000   | 0       | 8,591,900   | 98,100     | R6.4.12  | ②    |
| (8)         | 南部幹線配水管布設替(第1工区)工事     | 2,805,000   | 0       | 2,795,100   | 9,900      | R6.8.23  | ①    |
| (9)         | 南部幹線配水管布設替(第2工区)工事     | 5,478,000   | 0       | 5,464,800   | 13,200     | R6.8.9   | ①    |
| (10)        | 南部幹線配水管布設替(第3工区)工事     | 1,188,000   | 0       | 1,183,600   | 4,400      | R6.8.23  | ①    |
| 12          | 藤の木台一丁目地区配水管布設替(その1)工事 | 23,936,000  | 0       | 23,650,000  | 286,000    | R6.7.26  | ③    |
| 13          | 藤の木台二丁目地区配水管布設替(その5)工事 | 23,903,000  | 0       | 23,430,000  | 473,000    | R6.7.26  | ③    |
| 14          | 藤の木台二丁目地区配水管布設替(その6)工事 | 22,770,000  | 0       | 22,330,000  | 440,000    | R6.7.26  | ③    |
| 老朽基幹施設更新事業費 |                        | 4,653,000   | 0       | 4,620,000   | 33,000     |          |      |
| 15          | 下井田新第3水源導水管布設替(その1)工事  | 4,653,000   | 0       | 4,620,000   | 33,000     | R6.5.24  | ③    |
| 固定資産購入費     |                        | 19,063,000  | 0       | 17,996,000  | 1,067,000  |          |      |
| 16          | 下井田新浄水場不足用電圧継電器取替工事    | 418,000     | 0       | 396,000     | 22,000     | R6.12.13 | ③    |
| 17          | 友坂中継場計装機器取替工事          | 18,645,000  | 0       | 17,600,000  | 1,045,000  | R6.9.27  | ③    |
| 建設負担金       |                        | 18,861,000  | 0       | 12,571,380  | 6,289,620  |          |      |
| 18          | 八尾中核工業団地共同施設に係る改良工事負担金 | 18,861,000  | 0       | 12,571,380  | 6,289,620  | R6.7.31  | ③    |
| 合 計         |                        | 873,584,000 | 0       | 854,494,780 | 19,089,220 |          |      |

## 6 令和5年度富山市公共下水道事業会計予算繰越内訳調書

### 1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

令和5年度内に完了することが困難となった事業について令和6年度へ繰越措置を行なったもの。

総額：1,761,310,822円

### 2 主な繰越理由

①関係機関、地元関係者等との協議に日数を要したため

②他の関連工事との調整等に日数を要したため

③国庫補助金の追加内示に遅れが生じたため

### 3 繰越内訳書

(単位：円)

| 事業名及び名称  |                                         | 予算計上額         | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額        | 不用額        | 完成(予定)日  | 繰越理由 |
|----------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------|----------|------|
| 公共下水道築造費 |                                         | 1,247,111,422 | 0       | 1,236,389,722 | 10,721,700 |          |      |
| 1        | 奥田処理分区栗島三丁目地区下水管改築工事                    | 113,520,000   | 0       | 113,300,000   | 220,000    | R6.4.26  | ①    |
| 2        | 上飯野地区既設人孔耐震化(その4)工事                     | 17,017,000    | 0       | 16,940,000    | 77,000     | R6.5.31  | ①    |
| 3        | 新庄町一丁目地区既設人孔耐震化工事                       | 15,704,000    | 0       | 15,616,000    | 88,000     | R6.5.31  | ①    |
| 4        | 松川第二排水区桃井町二丁目地区浸水対策下水管布設工事              | 167,310,000   | 0       | 166,100,000   | 1,210,000  | R6.11.29 | ①    |
| 5        | 不二越処理分区山室地区下水管改築工事                      | 90,915,000    | 0       | 90,640,000    | 275,000    | R6.6.28  | ①    |
| 6        | 豊田処理分区海岸通地区下水管布設工事                      | 20,284,000    | 0       | 18,249,000    | 2,035,000  | R6.5.31  | ①    |
| 7        | 浸水対策基本計画策定(その2)業務委託                     | 66,990,000    | 0       | 66,990,000    | 0          | R6.9.30  | ①    |
| 8        | 浜黒崎浄化センター水処理施設共通設備外ストックマネジメント計画策定業務委託   | 28,790,000    | 0       | 28,790,000    | 0          | R6.9.30  | ①    |
| 9        | 中市排水区外中市雨水幹線外耐震診断調査業務委託                 | 11,242,000    | 0       | 11,242,000    | 0          | R6.7.5   | ①    |
| 10       | 本郷新地区電柱・架空線移設補償費(北電)                    | 1,161,680     | 0       | 1,161,680     | 0          | R6.12.20 | ①    |
| 11       | 本郷新地区架空線移設補償費(NTT)                      | 1,008,642     | 0       | 1,008,642     | 0          | R6.12.20 | ①    |
| 12       | 桃井町二丁目地区ガス管仮設工事                         | 22,285,000    | 0       | 22,285,000    | 0          | R7.3.31  | ①    |
| 13       | 水橋浄化センター沈砂池・1系水処理施設改築ストックマネジメント計画策定業務委託 | 22,100,000    | 0       | 22,100,000    | 0          | R6.9.30  | ①    |
| 14       | 浜黒崎浄化センター汚泥脱水設備外改築設計業務委託                | 43,530,000    | 0       | 43,530,000    | 0          | R7.3.31  | ①    |
| 15       | 本郷処理分区布市新町地区管渠基本設計業務委託                  | 15,015,000    | 0       | 15,015,000    | 0          | R6.8.30  | ①    |
| 16       | 下新第一排水区下新川雨水幹線築造(第12工区)工事               | 197,230,000   | 0       | 196,900,000   | 330,000    | R6.9.30  | ②    |
| 17       | 堀川小泉町一丁目地区マンホールトイレ施設整備工事                | 24,662,000    | 0       | 22,178,200    | 2,483,800  | R6.7.12  | ②    |

| 事業名及び名称 |                                 | 予算計上額      | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額     | 不用額       | 完成(予定)日  | 繰越理由 |
|---------|---------------------------------|------------|---------|------------|-----------|----------|------|
| 18      | 荏原第一排水区浸水対策検討業務委託               | 18,150,000 | 0       | 18,150,000 | 0         | R6.5.31  | ②    |
| 19      | 不二越処理分区長江新町三丁目管渠実施設計業務委託        | 20,438,000 | 0       | 18,700,000 | 1,738,000 | R6.5.31  | ②    |
| 20      | 松川処理分区地震対策等実施計画策定業務委託           | 7,306,200  | 0       | 7,306,200  | 0         | R6.7.12  | ②    |
| 21      | 奥田処理分区外管渠耐震診断調査業務委託             | 14,333,000 | 0       | 14,333,000 | 0         | R6.6.28  | ②    |
| 22      | いたち川第三処理分区外管渠耐震診断調査業務委託         | 14,245,000 | 0       | 14,245,000 | 0         | R6.7.19  | ②    |
| 23      | 松川第二排水区外諏訪川原第2雨水幹線外耐震診断調査業務委託   | 12,254,000 | 0       | 12,254,000 | 0         | R6.6.28  | ②    |
| 24      | 窪新町排水区外窪新町雨水幹線外耐震診断調査業務委託       | 14,839,000 | 0       | 14,839,000 | 0         | R6.7.12  | ②    |
| 25      | 不二越処理分区外管渠耐震診断調査業務委託            | 12,408,000 | 0       | 12,408,000 | 0         | R6.7.19  | ②    |
| 26      | 松川処理分区外管路施設改築計画策定業務委託           | 19,140,000 | 0       | 19,140,000 | 0         | R6.7.31  | ②    |
| 27      | 上赤江排水区外ガメ川雨水幹線外二次調査及び設計図書作成業務委託 | 13,475,000 | 0       | 13,475,000 | 0         | R6.5.31  | ②    |
| 28      | 富居処理分区田中町二丁目地区管渠実施設計業務委託        | 17,853,000 | 0       | 17,006,000 | 847,000   | R6.9.30  | ③    |
| 29      | 岩瀬第一排水区岩瀬第1雨水幹線バイパス水路実施設計業務委託   | 22,746,900 | 0       | 21,560,000 | 1,186,900 | R6.11.29 | ③    |
| 30      | 新庄町一丁目地区既設人孔耐震化(その2)工事          | 14,652,000 | 0       | 14,597,000 | 55,000    | R6.8.23  | ③    |
| 31      | 天正寺地区既設人孔耐震化工事                  | 18,315,000 | 0       | 18,216,000 | 99,000    | R6.8.23  | ③    |
| 32      | 奥井町地区既設人孔耐震化工事                  | 16,962,000 | 0       | 16,885,000 | 77,000    | R6.8.23  | ③    |
| 33      | 西長江第2汚水中継ポンプ所改築工事               | 14,630,000 | 0       | 14,630,000 | 0         | R6.10.31 | ③    |
| 34      | 大町第6汚水中継ポンプ所改築工事                | 15,400,000 | 0       | 15,400,000 | 0         | R6.10.31 | ③    |
| 35      | 水橋浄化センター沈砂池・ポンプ棟外耐水化基本設計業務委託    | 44,000,000 | 0       | 44,000,000 | 0         | R7.3.28  | ③    |
| 36      | 上赤江排水区ガメ川雨水幹線災害復旧実施設計業務委託       | 11,200,000 | 0       | 11,200,000 | 0         | R6.9.30  | ③    |
| 37      | 上赤江排水区ガメ川雨水幹線修景施設災害復旧実施設計業務委託   | 21,000,000 | 0       | 21,000,000 | 0         | R6.9.30  | ③    |
| 38      | 松川第二排水区松川雨水貯留施設災害復旧実施設計業務委託     | 15,000,000 | 0       | 15,000,000 | 0         | R6.9.30  | ③    |
| 39      | 富居処理分区外管渠災害復旧実施設計業務委託           | 30,000,000 | 0       | 30,000,000 | 0         | R6.9.30  | ③    |

| 事業名及び名称            |                          | 予算計上額         | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額        | 不用額        | 完成(予定)日  | 繰越理由 |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------|---------------|------------|----------|------|
| 流域関連公共下水道築造費       |                          | 75,384,100    | 0       | 72,953,100    | 2,431,000  |          |      |
| 40                 | 速星雨水ポンプ場電気設備改築工事         | 46,410,100    | 0       | 46,410,100    | 0          | R6.9.30  | ②    |
| 41                 | 神通川左岸処理区未整備地区整備可能性検討業務委託 | 8,690,000     | 0       | 8,690,000     | 0          | R6.6.28  | ②    |
| 42                 | 呉羽第一処理分区茶屋町地区管渠築造工事      | 20,284,000    | 0       | 17,853,000    | 2,431,000  | R6.7.26  | ②    |
| 特定環境保全公共下水道築造費     |                          | 40,779,200    | 0       | 29,810,000    | 10,969,200 |          |      |
| 43                 | 下条処理分区水橋石政地区管渠実施設計業務委託   | 40,779,200    | 0       | 29,810,000    | 10,969,200 | R6.9.30  | ②    |
| 流域関連特定環境保全公共下水道築造費 |                          | 34,870,000    | 0       | 32,758,000    | 2,112,000  |          |      |
| 44                 | 婦中町蔵島地区外公共柵設置工事          | 22,990,000    | 0       | 20,878,000    | 2,112,000  | R6.4.19  | ①    |
| 45                 | 金屋第2汚水中継ポンプ所改築工事         | 11,880,000    | 0       | 11,880,000    | 0          | R6.10.31 | ③    |
| 固定資産購入費            |                          | 399,520,000   | 0       | 389,400,000   | 10,120,000 |          |      |
| 46                 | 4系水処理設備現場盤シーケンサ取替(その2)工事 | 342,320,000   | 0       | 335,500,000   | 6,820,000  | R6.11.29 | ②    |
| 47                 | 凝集混和槽攪拌機更新工事             | 24,200,000    | 0       | 23,100,000    | 1,100,000  | R6.9.30  | ②    |
| 48                 | 水橋浄化センター焼却設備コントローラ更新工事   | 33,000,000    | 0       | 30,800,000    | 2,200,000  | R7.3.14  | ②    |
| 合 計                |                          | 1,797,664,722 | 0       | 1,761,310,822 | 36,353,900 |          |      |
