

# 令和7年12月市議会定例会

## 上下水道局

### 議案説明資料

#### 目 次

##### 【予算案件】

##### (水道事業会計)

1 債務負担行為の設定について	.....	1 頁
-----------------	-------	-----

##### (公共下水道事業会計)

2 継続費の変更について	.....	8 頁
--------------	-------	-----

【水道事業会計】

1 債務負担行為の設定について

[水道課]

(1) 債務負担行為の目的

- ・年間を通した切れ目ない発注による受注機会の確保
- ・工期確保のための早期発注

(2) 今回の要求内容

対象事業	期 間	限 度 額
水 道 事 業	令和7年度～令和8年度	505,000千円

債務負担行為概要

番号	配水ブロックの整備	工事概要	施工箇所	工事費
①	布谷配水池改良工事	電気室改良 1式	八尾町布谷	15,200千円
②	三ツ松受水槽築造工事	受水槽築造 1式	八尾町倉ヶ谷	39,200千円
③	布谷配水池外機械設備工事	機械設備 1式	八尾町布谷外	28,900千円
④	布谷配水池外電気設備工事	電気設備 1式	八尾町布谷外	63,067千円
⑤	三ツ松地区外配水管布設替工事	配水管布設替 L=530m 減圧弁設置 1基	八尾町三ツ松外	116,000千円
小計				262,367千円

番号	老朽水道管の整備	工事概要	施工箇所	工事費
⑥	上赤江町一丁目地区配水管布設替工事	配水管布設替 L=630m	上赤江町一丁目 外	124,675千円
⑦	上赤江町二丁目地区配水管布設替工事	配水管布設替 L=460m	上赤江町二丁目	95,598千円
⑧	小見地区配水管布設替工事	配水管布設替 L=260m	小見	22,360千円
小計				242,633千円

[参考] 過去の債務負担行為設定額

(単位：千円)


年度	債務負担設定額	年度	債務負担設定額
平成28年度	400,000	令和3年度	430,000
平成29年度	350,000	令和4年度	630,000
平成30年度	350,000	令和5年度	521,000
令和元年度	350,000	令和6年度	869,000
令和2年度	426,000	令和7年度(今回)	505,000

### (3) 令和7年度債務負担行為財源内訳書

(単位：千円)

	限度額	財 源 内 訳			備 考
		国庫支出金	企 業 債	そ の 他	
配水施設費	505,000	0	429,200	75,800	自主財源 75,800
合 計	505,000	0	429,200	75,800	自主財源 75,800




# 八尾配水ブロック整備計画図

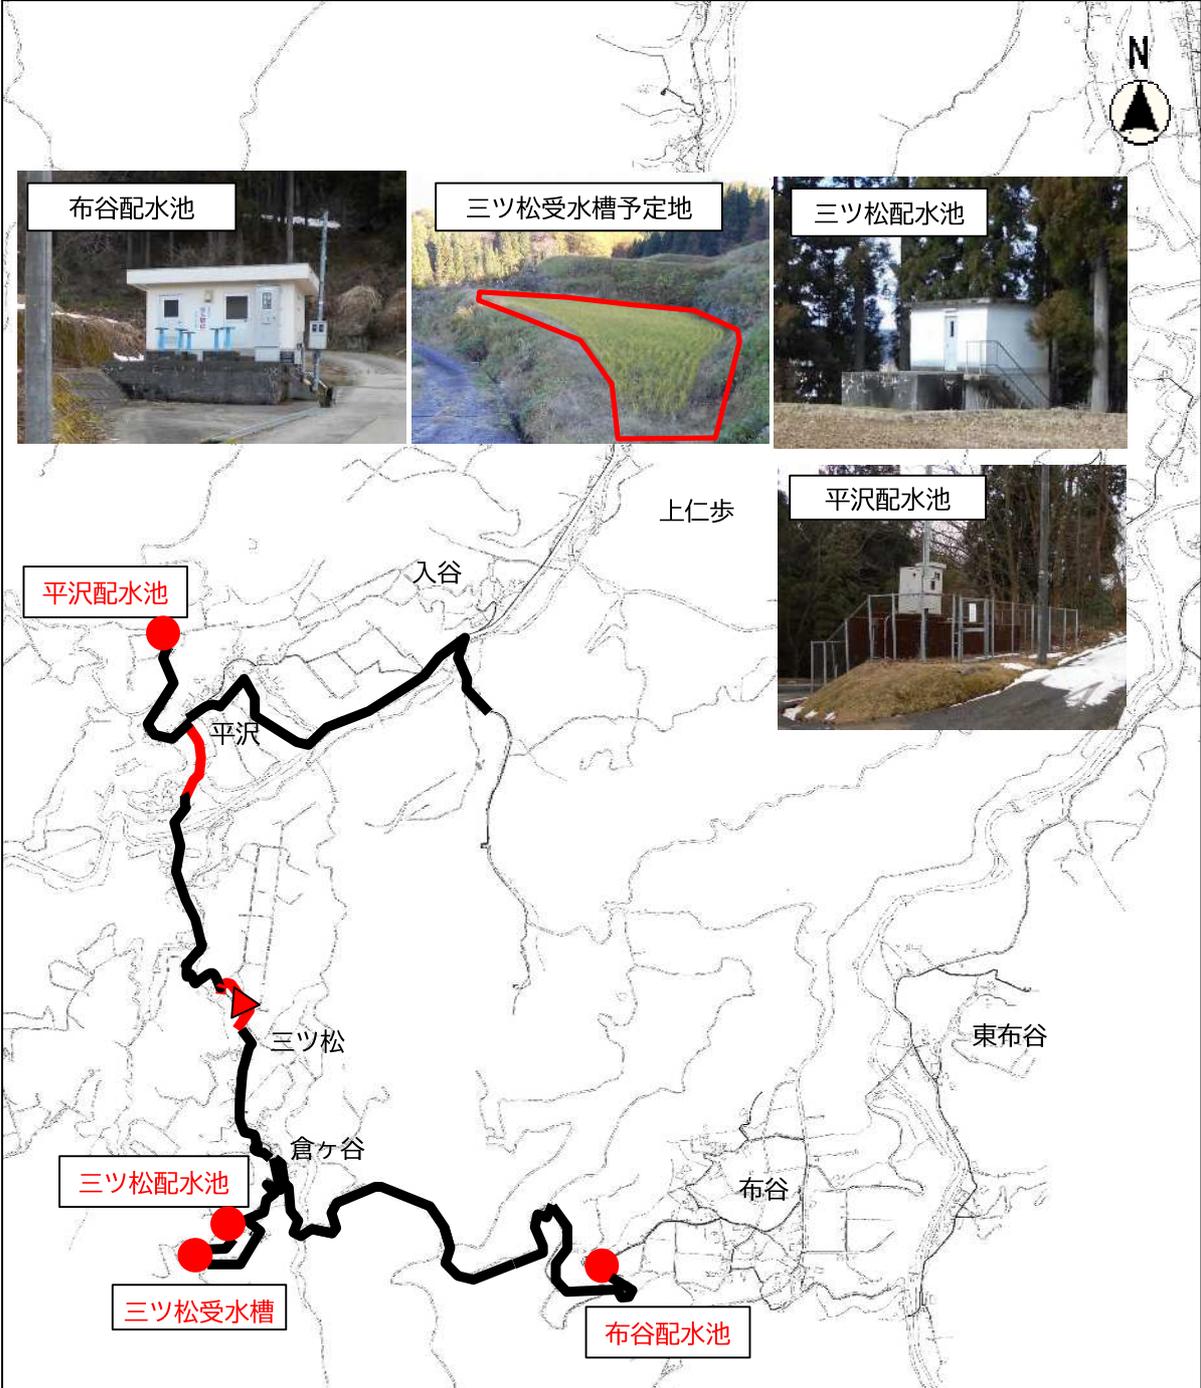

①	布谷配水池改良工事	1式	事業費	15,200千円
②	三ツ松受水槽築造工事	1式	事業費	39,200千円
③	布谷配水池外機械設備工事	1式	事業費	28,900千円
④	布谷配水池外電気設備工事	1式	事業費	63,067千円
⑤	三ツ松地区外配水管布設替工事			
	φ100DIP 530m 減圧弁	1基	事業費	116,000千円

令和7年度債務負担行為箇所

(計画)

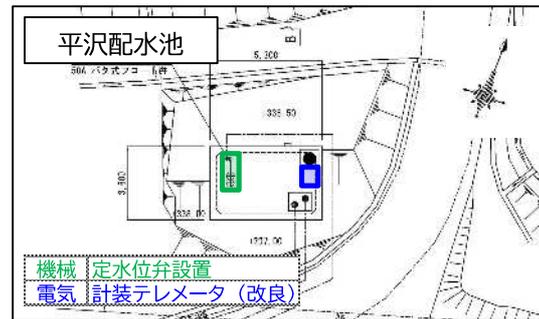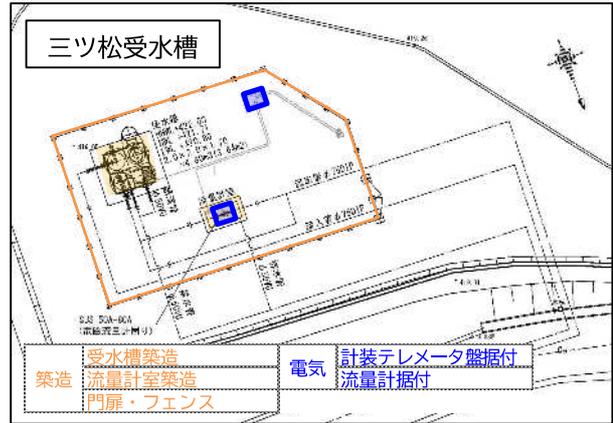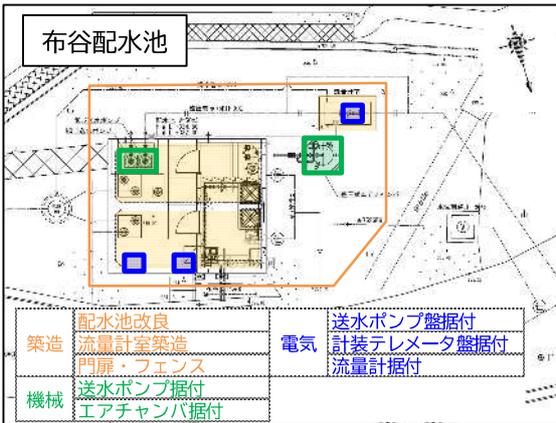


全体計画工程表

	令和7年度			令和8年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 布谷配水池 改良工事															
入札、契約手続き	■	■													
準備、片付け			■												
現地施工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
② 三ツ松受水槽 築造工事															
入札、契約手続き	■	■													
準備、片付け			■												
現地施工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
③ 布谷配水池外 機械設備工事 (布谷配水池、三ツ松配水池、平沢配水池)															
入札、契約手続き	■	■													
準備、片付け			■												
工場製作				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
現地施工								■	■	■	■	■	■	■	■
④ 布谷配水池外 電気設備工事 (布谷配水池、三ツ松受水槽、三ツ松配水池、平沢配水池)															
入札、契約手続き	■	■													
準備、片付け			■												
工場製作				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
現地施工									■	■	■	■	■	■	■
⑤ 三ツ松地区外配水管布設替工事															
入札、契約手続き	■	■													
準備、片付け			■												
現地施工				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
減圧弁製作															
水質確認・水質検査												■	■	■	■
届出・供用開始手続き														■	■

※令和8年度末に施設を供用開始する計画としており、今後の工事や水質検査などの準備期間を考慮すると、令和8年末までに工事を完了させる必要があるため、令和7年度中の発注が必要である。

# 上赤江町一丁目外地区配水管布設替工事計画図

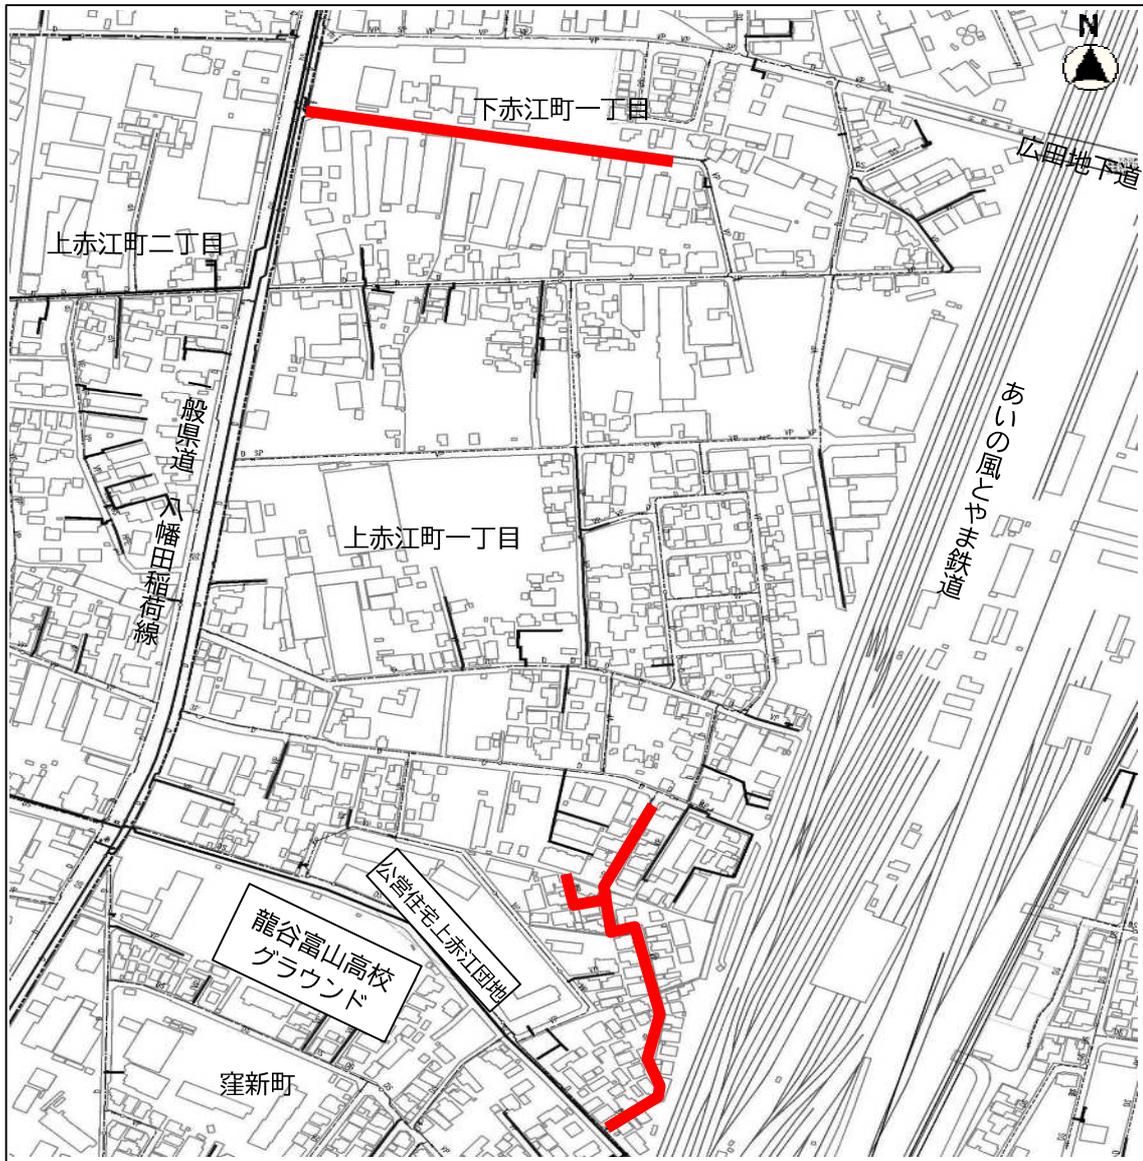

⑥


・上赤江町一丁目外地区配水管布設替工事  
φ100DIP 270m、φ50HPPE 360m 事業費 124,675千円

■■■■ 令和7年度債務負担行為箇所

※狭小な道路での工事であり、冬季での施工は除雪の支障となるなど、住民生活への影響が生じることから、冬を迎える前に確実に工事を完了させるためには、令和7年度中の発注が必要である。



# 配水管布設替工事計画図

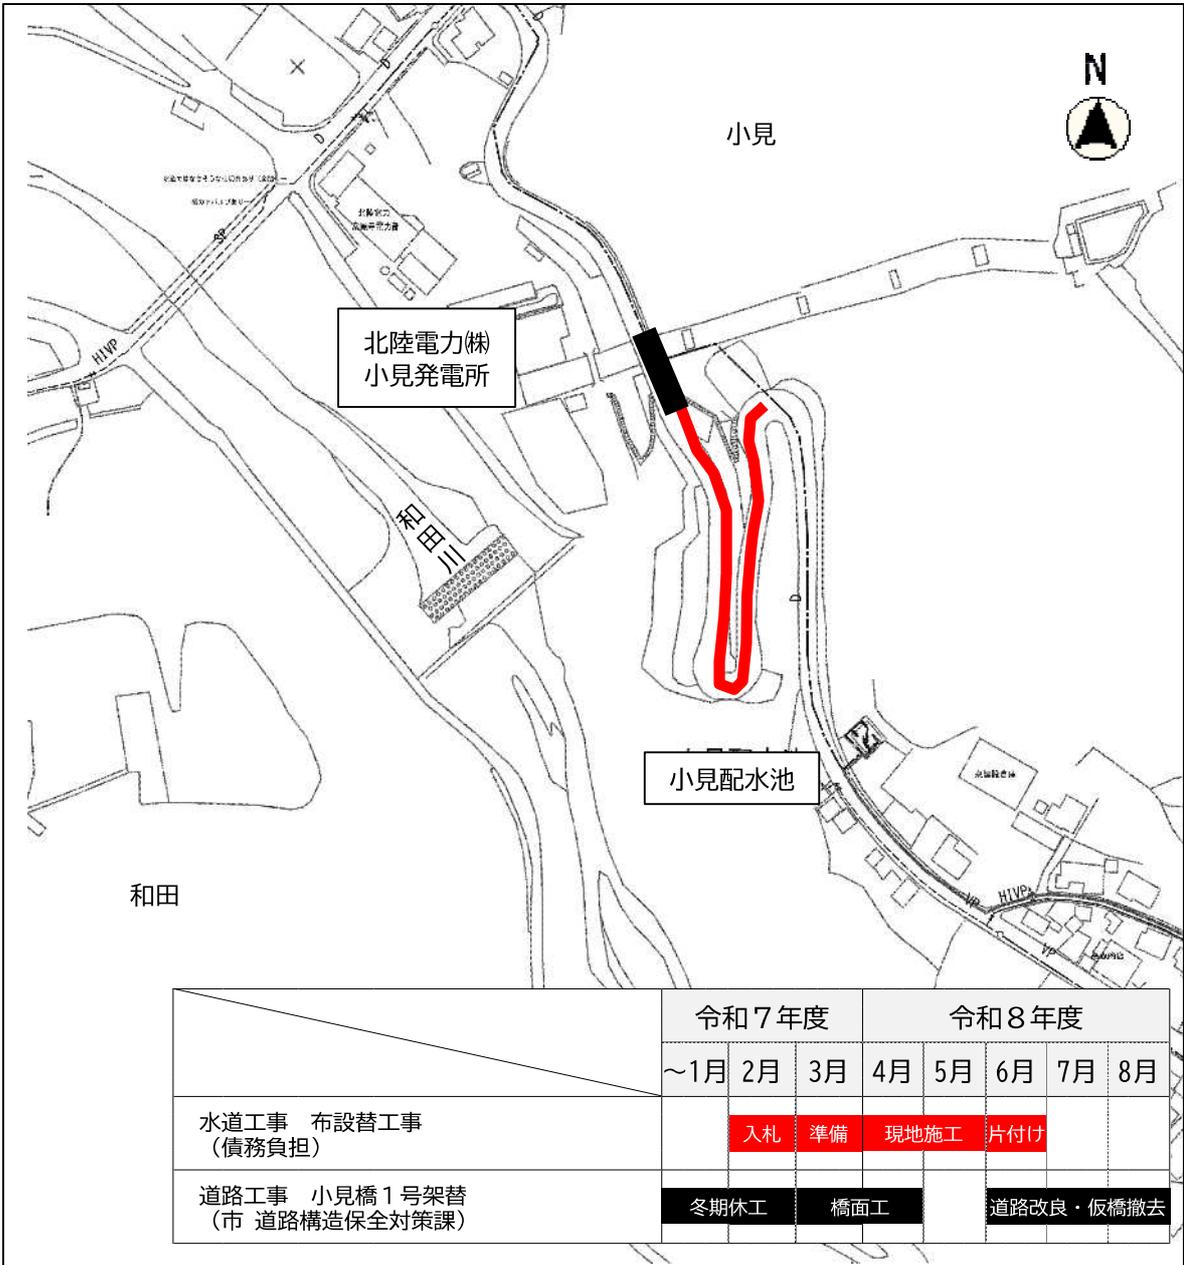

8

・配水管布設替工事（小見地内）  
 φ100 HPPE 260m 事業費 22,360千円

令和7年度債務負担行為箇所

※小見地内において、市が施工する道路改良工事（小見橋1号架替え）のスケジュールに合わせて、配水管布設替を施工する必要があるため、令和7年度中の発注が必要である。

## 2 継続費の変更について

### (1) 富山公共下水道大沢野浄化センター自家発電棟建築新設工事委託の継続費の変更について

[下水道課]

#### ア. 全体概要

大沢野浄化センターは、日本下水道事業団の技術的援助を受けて建設した基幹施設であり、災害時においても施設の機能を確保するための自家発電設備の設置に向けて、高度な技術を有し本処理場の構造等に精通している日本下水道事業団に設計委託し計画を進めてきたところである。

本業務は、自家発電設備を設置するための自家発電棟の建築工事委託を日本下水道事業団と協定締結したものであり、鋭意施工中である。

- ・受託者 地方共同法人 日本下水道事業団
- ・協定額 178,900,000円  
(事業費178,900千円)
- ・協定期間 令和6年8月22日 から  
令和8年3月31日 まで



自家発電棟建築イメージ



大沢野浄化センター H4. 4供用開始

#### イ. 変更理由

本委託は日本下水道事業団において入札を行っているが、2度の入札不調を経て、3度目の入札により施工業者が決定した。このことから工程の見直しが必要となったことに加え、地元との調整に不測の日数を要したことから協定期間内の完成が困難となったことにより協定期間の延長を行うもの。

## ウ. 協定期間

年 月 工 種		令和6年度						令和7年度							令和8年度											
		7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
協定																										
建築新設工事	準備工																									
	建築工	躯体工																								
		電気設備工																								
		機械設備工																								
	後片付け・書類作成																									

当初	
変更	

## 工. 変更計画 (案)

(単位：千円)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	計
当初年割	35,900	143,000		178,900
変更年割	35,900	113,000	30,000	178,900
